


Byggepladsinfo 3/12 15

Frederiksplads

Grundet uforudsete forhold i undergrunden, er byggeriet generet af dette og der pågår nu projektaflaringer for en fortsat kontinuerlig fremdrift. Fremdriften er grundet ovenstående forhold forsinket, og der kommer en forskydning i det allerede planlagte arbejde.

Da projektaflaring pågår, kan der på nuværende tidspunkt ikke oplyses en præcis plan for de kommende aktiviteter. Nedenstående arbejdsplan beskriver de overordnede aktiviteter, og der forventes at kunne udarbejdes en mere præcis arbejdsplan umiddelbart i det nye år.

Vi vil ønske alle naboerne en rigtig god julemåned og et godt nytår.

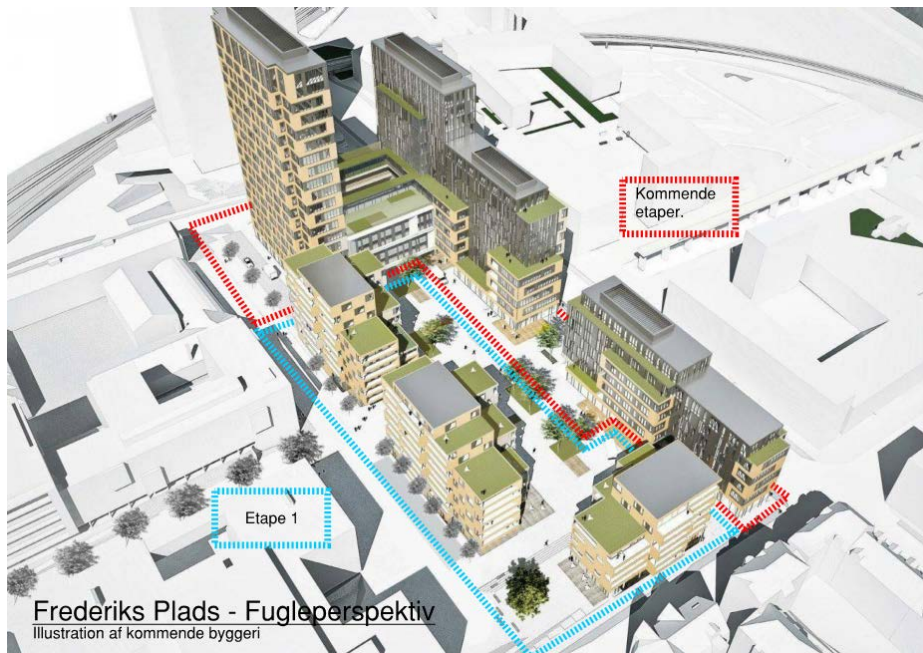

Forventet arbejdsplan - december 2015:

- Boring og installering af jordankre.
- Opgravning og bortkørsel af jord i forbindelse med jordankre og kælderudgravning.
- Pæleramning forventes påbegyndt januar/februar måned og strækker sig over en 3 – 4 måneders periode for etape 1.

Arbejdstider:

- Arbejdet vil som udgangspunkt blive udført indenfor normale arbejdstider jf. gældende regler i Aarhus Kommune. I perioden mellem kl. 7.00-18.00.
- Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage.

Information til naboer samt andre berørte af byggeriet:

- Ny byggepladsinfo udgives, hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse og ca. hver anden måned. Denne info vil kunne findes på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen "Naboorientering".



Ib Høgsberg
Senior Projektchef,
NCC Construction Danmark

+4591373956
ibbhog@ncc.dk

FOLDER

